

AxTO

(si legge Apertò)



Azioni per le periferie torinesi



AxTO

(si legge Apertò)



Azioni per le periferie torinesi

AxTO parte nella primavera del 2017 e termina nel dicembre del 2019.

Siamo a metà percorso e si può fare un **primo bilancio** delle attività svolte, di quelle in itinere e di quelle da avviare.

Il programma, dopo i primi mesi contraddistinti dal lavoro di tipo amministrativo (impegni di spesa, espletamento delle gare, contratti) propedeutico all'avvio delle attività, è entrato nel vivo e la quasi totalità delle 44 azioni previste ha avuto inizio.

In questo breve documento verranno forniti alcuni **dati sintetici** che illustrano l'**avanzamento del programma**. I dati sono riferiti allo stato di avanzamento al 30 settembre 2018.

Azioni per le periferie torinesi

Programma per la riqualificazione
e la sicurezza delle periferie



Tutti i grafici che seguono rappresentano l'avanzamento delle attività utilizzando come **indicatore** quello **finanziario**.

Si è suddivisa l'analisi con un doppio riferimento: il primo relativo al contributo ricevuto, il secondo all'intero programma, comprendendo quindi i diversi cofinanziamenti (Città, altri enti pubblici, privati).


La Città, prima di qualsiasi relazione con terzi, deve definire le attività, individuando le procedure e i destinatari delle risorse, passando quindi dal livello di fattibilità a quello esecutivo.

Ciò corrisponde, in termini finanziari, alle **risorse impegnate**.



Con riferimento al programma complessivo, le **risorse ancora da impegnare** percentualmente crescono, rispetto al 2% del grafico precedente.

Sono infatti contabilizzate come non impegnate tutte le risorse private che garantiscono il cofinanziamento a fronte di agevolazioni pubbliche.

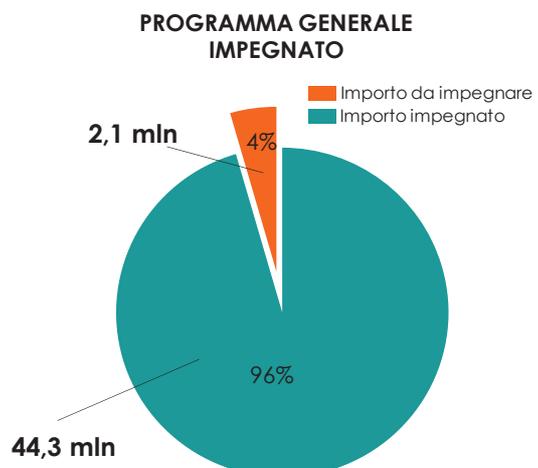


A seguito degli impegni di spesa, si procede alle gare e si contrattualizzano le **attività**, definendo così il **valore effettivo** delle stesse.

In questa fase vengono anche quantificate le eventuali economie.

L'attuale convenzione prevede che esse riconfluiscono allo Stato. Possono finanziare ulteriori opere o incremento dei servizi a seguito di richiesta della Città e solo dopo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


CONTRIBUTO OGGETTO DI CONTRATTO

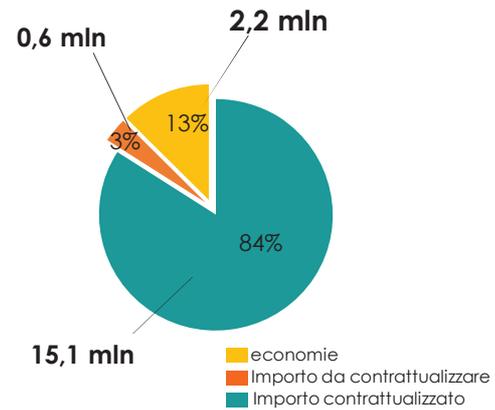

Le risorse contrattualizzate possono essere anche misurate per l'intero programma.

Le **economie** sono solo **relative alle risorse pubbliche**, sia derivate dal contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia da altre fonti pubbliche comprese quelle della Città, in quanto soggette a procedure ad evidenza pubblica.

PROGRAMMA GENERALE

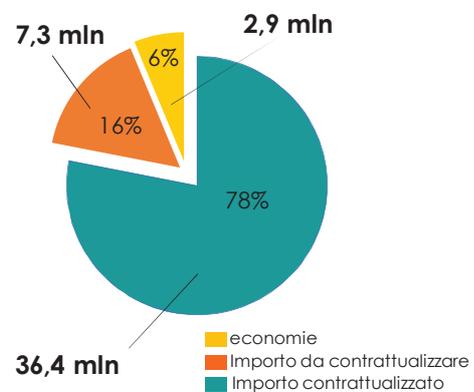

L'ultimo dato finanziario sintetico riguarda le **spese effettivamente realizzate**, con riferimento sia alle opere pubbliche sia alle attività immateriali.

La somma totale è inferiore all'ammontare del contributo, in quanto non sono qui contabilizzate le economie e alcune spese tecniche quali, ad esempio, le risorse accantonate per imprevisti.


La percentuale raggiunta è **in linea con le previsioni**, ricordando che le attività di spesa vere e proprie sono iniziate solo successivamente all'attività amministrativa propedeutica (espletamento delle gare).



La differenza che si evince rispetto alla percentuale di attività realizzate esclusivamente con il finanziamento della Presidenza è motivato dall'importo di **14 mln di euro già spesi** da parte dei privati, per l'avvio del polo di innovazione dell'Incet.



Tale importo è inserito nel programma complessivo quale **cofinanziamento privato** del programma AxTO.

Parimenti a quanto detto prima, la somma è inferiore al totale dei 46 mln in quanto non sono qui contabilizzate le economie e le spese tecniche.

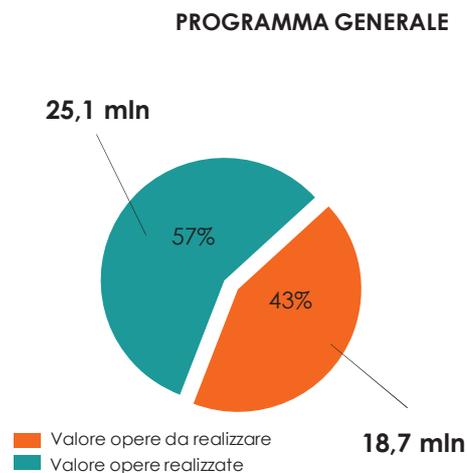

L'analisi della ripartizione tra spese sostenute e da sostenere è anche significativa relativamente ai cinque assi di AxTO.

Il dato è qui fornito solo rispetto al programma complessivo. Come già detto, per l'asse 3 la percentuale così rilevata di opere già realizzate è dovuta al peso che assume il polo Incet.

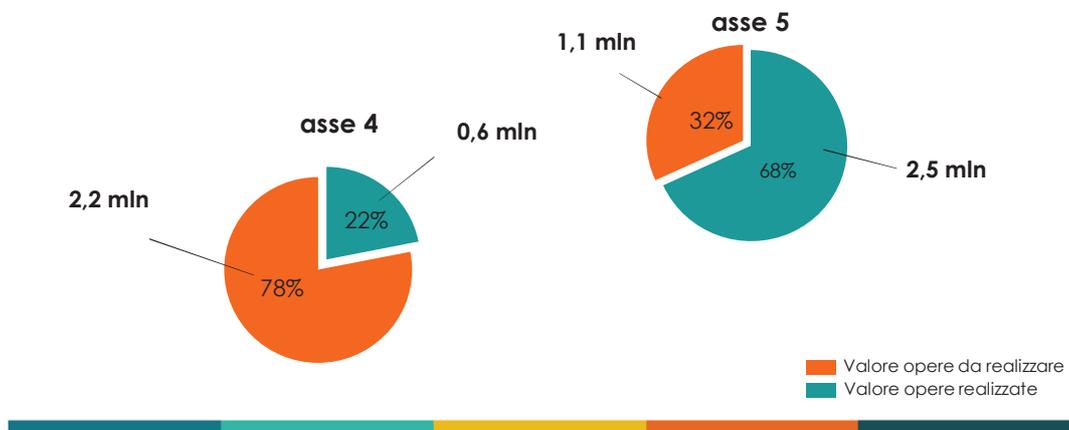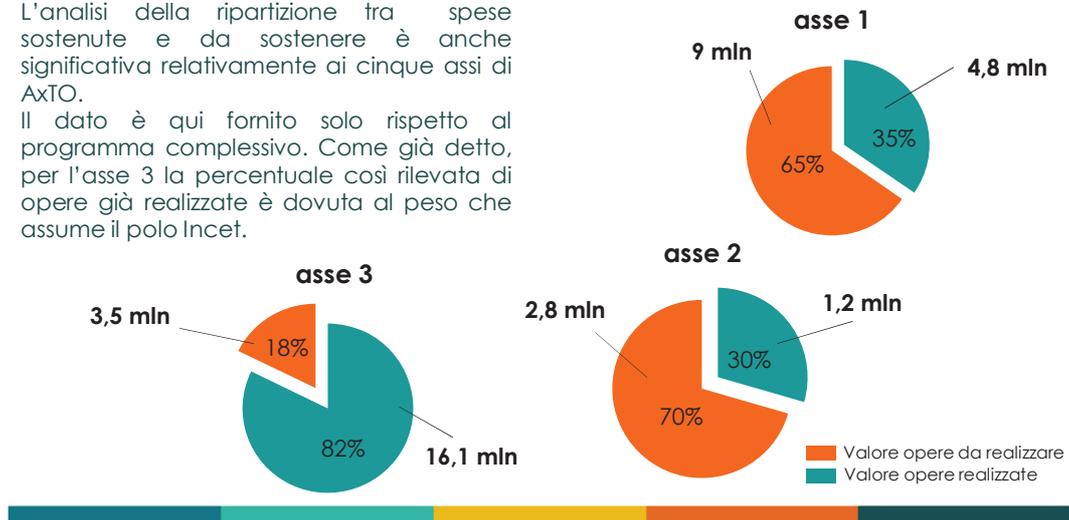


Un altro indicatore riguarda il numero di cantieri, le azioni avviate, le attività in corso, il numero di sportelli aperti.

Il dato, in particolare per le attività, è difficile da costruire, anche perché alcune di esse interessano più punti della città. Un esempio eclatante riguarda i progetti finanziati con contributo.

Più semplice la questione dei cantieri. Per questi si è ormai oltre il 50% dei cantieri con opere già realizzate. Questo dato va letto con i grafici precedenti, in quanto i cantieri non sono, per dimensioni, tra loro confrontabili.

Nelle prossime settimane si avvierà il cantiere per il completamento di Parco Dora che interessa il 10% (oltre 4,5 mln) del costo globale del progetto.

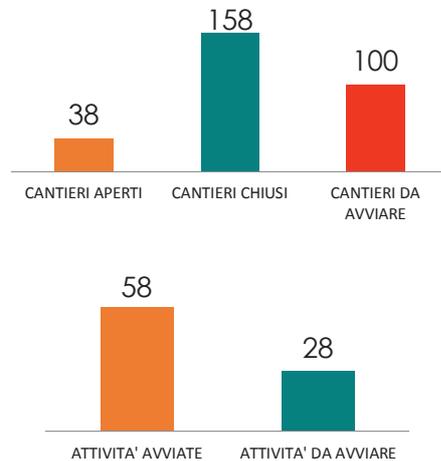


Gli **sportelli** dell'*assistenza tecnica* e *accompagnamento sociale* svolgono un ruolo fondamentale di **interfaccia** tra gli uffici della Città e la cittadinanza, fornendo notizie su AxTO, ma anche facilitando l'accesso a informazioni, servizi e opportunità non strettamente legate ad AxTO.

Sono organizzati con due modalità: **sede fissa** (2) e **sede itinerante** (2).

La modalità itinerante si è dimostrata assai efficace.

Rispetto a esperienze pregresse, la presenza dello sportello mobile ha modificato notevolmente la composizione dell'utenza relativamente all'età, con un maggior coinvolgimento dei giovani.



55.500

mq di strade asfaltate

1

Biblioteca itinerante

26

scuole riqualificate

17

alloggi acquisiti

1+3+2

sito web pagine fb e instagram

5494

studenti e alunni coinvolti

65

imprese/associazioni finanziate

5

attrezzature sportive e culturali

450+1500

alberi piantati e alberi potati

20

sportelli aperti



AxTO per le scuole

